

4. 事業計画の変更の概要

4. 1 事業計画の変更の概要及び理由

(1) 事業計画変更の概要

用地取得の遅れ等の理由により既定事業を期間内に完了できないため、表 4.1-1(1)、(2)に示すとおり、供用開始を令和3年度から令和4年度に、工事期間を「平成20年度から令和2年度(予定)」から「平成20年度から令和3年度(予定)」に変更する。

表 4.1-1(1) 事業計画の概要【変更後】

供 用 開 始	令和 <u>4</u> 年度(予定)
工 事 期 間	平成20年度から令和 <u>3</u> 年度(予定)

注) 下線は、変更箇所を示す。

表 4.1-1(2) 事業計画の概要【変更前】

供 用 開 始	令和3年度(予定)
工 事 期 間	平成20年度から令和2年度(予定)

(2) 事業計画変更の理由

本事業は、平成16年度より測量・調査に着手し、平成18年度から用地取得を進め、順次工事を行ってきた。令和元年6月に交通開放したが、用地取得の遅れ等により工事の延期が生じたため、変更届(平成30年3月29日)に示した事業計画より供用開始時期及び工事期間を変更する。

4. 2 事業の進捗状況

現在、残る道路植栽工事及び舗装工事を継続して実施している。

5. 事業計画の変更の内容

5. 1 事業の工程の変更

事業計画の変更に伴い、表 5.1-1(1)、(2)に示すとおり事業の工程を変更する。

表 5.1-1(1) 事業の工程【変更後】

	平成 16 年度	17 年度	18 年度	19 年度	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	令和 元 年度	2 年度	3 年度
測量調査	■																	
用地取得			■															
道路工事									■									

表 5.1-1(2) 事業の工程【変更前】

	平成 16 年度	17 年度	18 年度	19 年度	20 年度	21 年度	22 年度	23 年度	24 年度	25 年度	26 年度	27 年度	28 年度	29 年度	30 年度	令和 元 年度	2 年度	
測量調査	■																	
用地取得			■															
道路工事									■									

5. 2 計画交通量について

供用開始時期及び周辺ネットワークが概ね完成すると想定される時期における計画交通量については、事業期間の変更に伴う推計結果に変更が生じないことから見直しは行わない。

よって、変更後の計画交通量は評価書と同様とし、表 5.2-1 に示すとおり供用開始時期及び周辺道路ネットワークが概ね完成すると想定される時期それぞれの年次のみを変更する。

表 5.2-1 計画交通量

(単位：台/日)

推計の対象時点	A 断面	B 断面
令和 4 年度	39,200	44,200
令和 12 年度	37,500	37,000

令和 4 年度：供用開始時期

令和 12 年度：周辺の道路ネットワークが概ね完成すると想定される時期

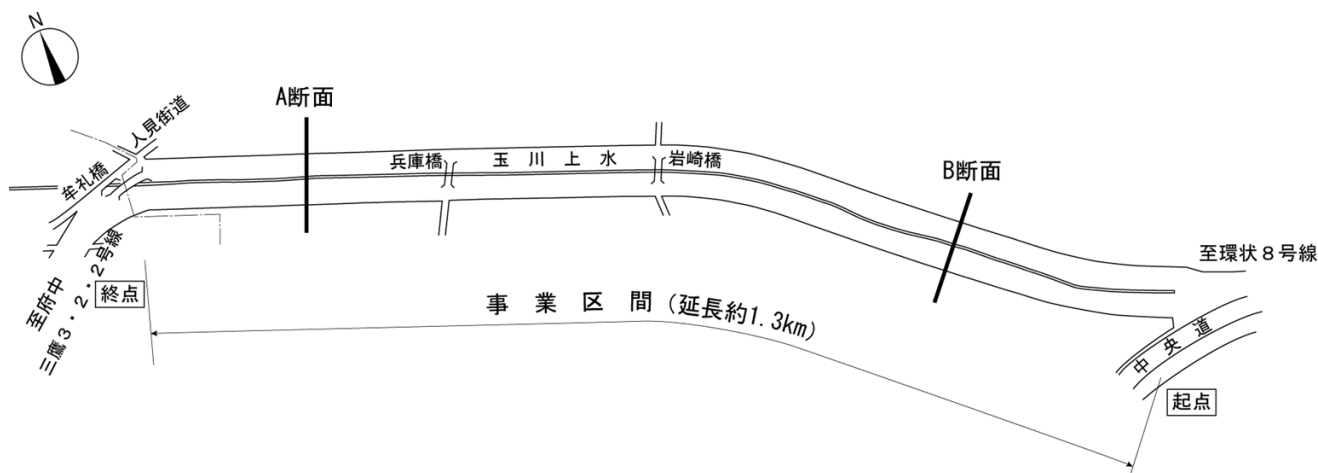


図 5.2-1 計画交通量の推計断面
