

4. 事業計画の変更の概要

4.1 変更理由

下記の理由により、事業の工事工程を変更する。

- (1) 施工中の土木・建築・設備工事の競合工事 9 件について、限られた作業範囲における施工環境の見直し等を行った結果、遅延が生じた。
- (2) 新型コロナウイルスの影響に伴う関係部署との協議に時間を要したため、遅延が生じた。

工事工程表を表 4-2 及び表 4-3 に示す。

4.2 事業計画の変更の内容

東尾久浄化センターの関連施設と位置付けている雨水ポンプ棟の一つである尾久系主ポンプ室の工事工程を変更する。

なお、工種、工法、施工規模等の工事内容に変更はなく、完了後の施設の配置や用途等の変更もない。

事業計画の変更の内容を表 4-1 に示す。

表 4-1 事業計画の変更の内容

項目	事業計画の変更の内容
【変更後】	工事工程 ・ 竣工年度： <u>令和 11 年度</u> (尾久系主ポンプ室： <u>令和 5 年度</u>)
【変更前】	工事工程 ・ 竣工年度：令和 8 年度 (尾久系主ポンプ室：平成 32 年度)

注) 下線部は変更部分を示す。

表 4-2 工事工程表 (変更後)

東尾久浄化センター建設工事工程計画表 (変更後)

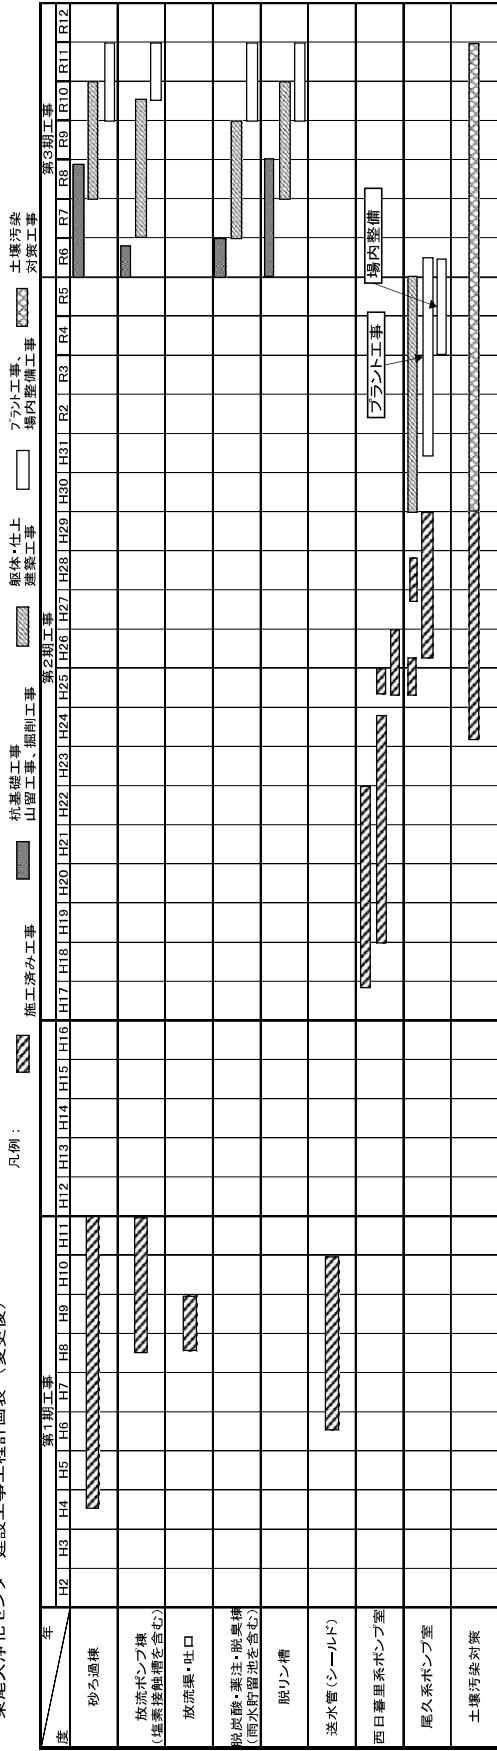


表 4-3 工事工程表 (変更前)

東尾久浄化センター建設工事工程計画表 (変更前)

